

ERWIN PEETZ GMBH & CO. KG

VARIO-SEC® Stahlfertigteile
Dasinger Straße 2
86165 Augsburg

T: +49 (0) 821 7020-20
F: +49 (0) 821 7019-58
info@peetz-augsburg.de
www.peetz-gruppe.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Alexandra Peetz
Elmar Heimes

ERWIN PEETZ GMBH & CO. KG | Dasinger Straße 2 | 86165 Augsburg

Firma
LTS Lindermayr GmbH
Bauunternehmung
Frau Fidan
Innere Industriestraße 26
86316 Friedberg-Derching

ANGEBOT Nr.:
VS - 0120 - 5693

per Telefax 0821/78001-50

Datum: 31. Jan. 2020

Abbaugelände Affing/Mühlhausen, Bachunterführung

Sehr geehrte Frau Fidan,
wir beziehen uns auf unser Telefongespräch mit Ihnen und übersenden Ihnen unser Angebot für einen Stahlfertigteildurchlaß in obigem Bauvorhaben, hoffen Ihnen kostengünstig angeboten zu haben und würden uns über eine gute Zusammenarbeit freuen.

Durchlaßbauwerk aus gewellten und gebogenen Stahlfertigteilen, Welle 200x55, als Korbbogen-Profil SB 10 mit folgenden Abmessungen:

Spannweite:	4,77	[m]	
Höhe:	1,57	[m]	
Umfang:	6,22	[m]	
Querschnitt:	5,66	[m ²]	
Überschüttung:	1,10	[m]	Mindestüberdeckung gem. ZTV-ING!
Verkehrslast:	DIN EN 1991-2		
Plattendicke:	7,00	[mm]	
Kreuzungswinkel:	100,00	[gon]	
Bauwerksabschlußwinkel:	100,00	[gon]	
Schnittansatzhöhe:	0,17	[m]	
Längsgefälle:	0,00	[%]	
Böschungsnäigung:	1:1,5		

feuerverzinkt gemäß ZTV-ING (Teil 9, Abschnitt 4) und DIN EN ISO 1461 (DIN 50976)

herstellen, frei befahrbarer Baustelle anliefern und auf bauseitig hergestellten und höhen und fluchtgerechten Betonwiderlager mit Aussparung sach- und fachgerecht montieren mit allen dazu erforderlichen Geräten und Werkzeugen.

Es wird vorausgesetzt eine trockene Baugrube sowie einseitige Zugänglichkeit für unseren Montagekran.

Lieferung einschließlich angeschweißter Fußplatte 100x10 mm.

Lieferung und Montage von Befestigungsankern im Bereich der Schrägschnitte zum konstruktiven Verbund mit dem bauseitigen Böschungskranz.

Eingerechnet ist ein prüffähiger Standsicherheitsnachweis für das Korbbogenprofil sowie die Auflagerkräfte für die erforderlich werdenden Fundamente. (Eine Statik für Fundamente ist von uns nicht lieferbar.)

Das Vergießen der Auflagerfügen erfolgt bauseits durch die Baufirma.

Menge:	Einheit:	Einheits-Preis:	Gesamtpreis:
11,60	lfdm	2.496,00 €	28.953,60 €

Übertrag: 28.953,60 €



VOLKSBANK BIGGE-LENNE EG
IBAN: DE98 4606 2817 0061 6008 00
BIC: GENODEM1SMA

STADTSPARKASSE SCHMALLEMBERG
IBAN: DE75 4605 2855 0000 0998 53
BIC: WELADED1SMB

AG SIEGEN: HRA 6869
PHG: Erwin Peetz Verwaltungs-GmbH
AG SIEGEN: HRB 6063

ANGEBOT Nr.: VS - 0120 - 5693

Übertrag:

 Gesamtpreis:
 28.953,60 €

Durchlaßbauwerk wie oben beschrieben werkseitig mit einer Kunststoff-
 beschichtung auf Epoxydharzbasis versehen, **90 µm**, gemäß DIN 55928
 Teil 5, Tab. 7, sowie ausbessern von Transport- und Montageschäden.

Menge:	Einheit:	Einheits-Preis:	Bedarfsposition
11,60	ldm	330,00 €	
		netto:	28.953,60 €
		19 % MWSt	5.501,18 €
		brutto:	34.454,78 €

Bitte beachten Sie, daß bei Korbbogen-Profilen an den Seiten zusätzliche Widerlager aus Stahlbeton (Schubbalken) bauseitig durch die Baufirma anzuordnen sind. Durch diese Widerlager wird das Tragverhalten der Konstruktion während der Hinterfüllung und im Endzustand wesentlich verbessert.

Lieferzeit: ca. 6 Wochen nach Erhalt der Fertigungsmaße
 Zahlung: 30 Tage netto, bzw. nach Vereinbarung
 Bindefrist: 3 Monate

Mit freundlichen Grüßen
 E. Peetz - Vario Sec



(Alexander Unger Dipl.-Ing. (FH))
 (E-Mail: a.unger@peetz-augsburg.de)




VOLKSBANK BIGGE-LENNE EG
 IBAN: DE98 4606 2817 0061 6008 00
 BIC: GENODEM1SMA

STADTSPARKASSE SCHMALLEMBERG
 IBAN: DE75 4605 2855 0000 0998 53
 BIC: WELADED1SMB

AG SIEGEN: HRA 6869
 PHG: Erwin Peetz Verwaltungs-GmbH
 AG SIEGEN: HRB 6063

VARIO-SEC® Stahlfertigteile


VARIO-SEC Korbbogen-Profil SB 10

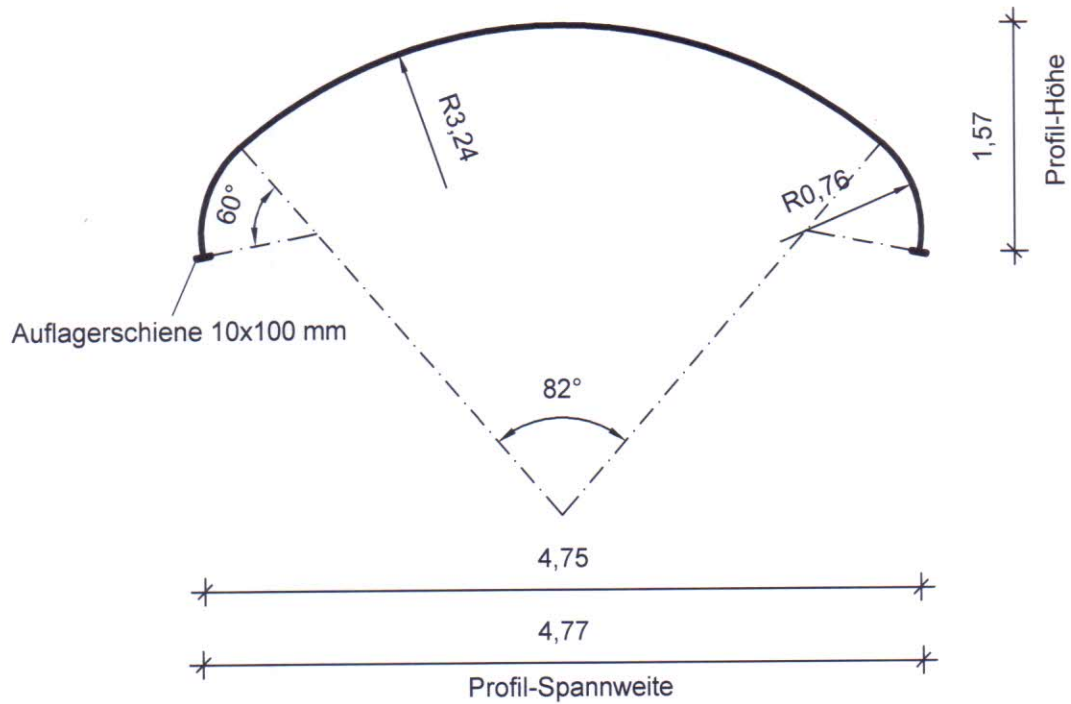

Erwin Peetz GmbH & Co. KG, Büro Augsburg
 Dasinger Straße 2, 86165 Augsburg
 Tel. 0821/70 20 20, Fax 70 19 58

Bauteil:	Querschnitt	
VARIO-SEC Multi-Plate 200x55	Maßstab	1:50
Korbbogenprofil SB 10	Datum	16.10.2014
Spannweite: 4,77 / 4,74 m	Gezeichnet	Unger Dipl.-Ing. (FH)
Höhe: 1,57 m	Änderung	
Fläche: 5,66 m ²		
Umfang: 6,22 m		

VARIO-SEC® Stahlfertigteile

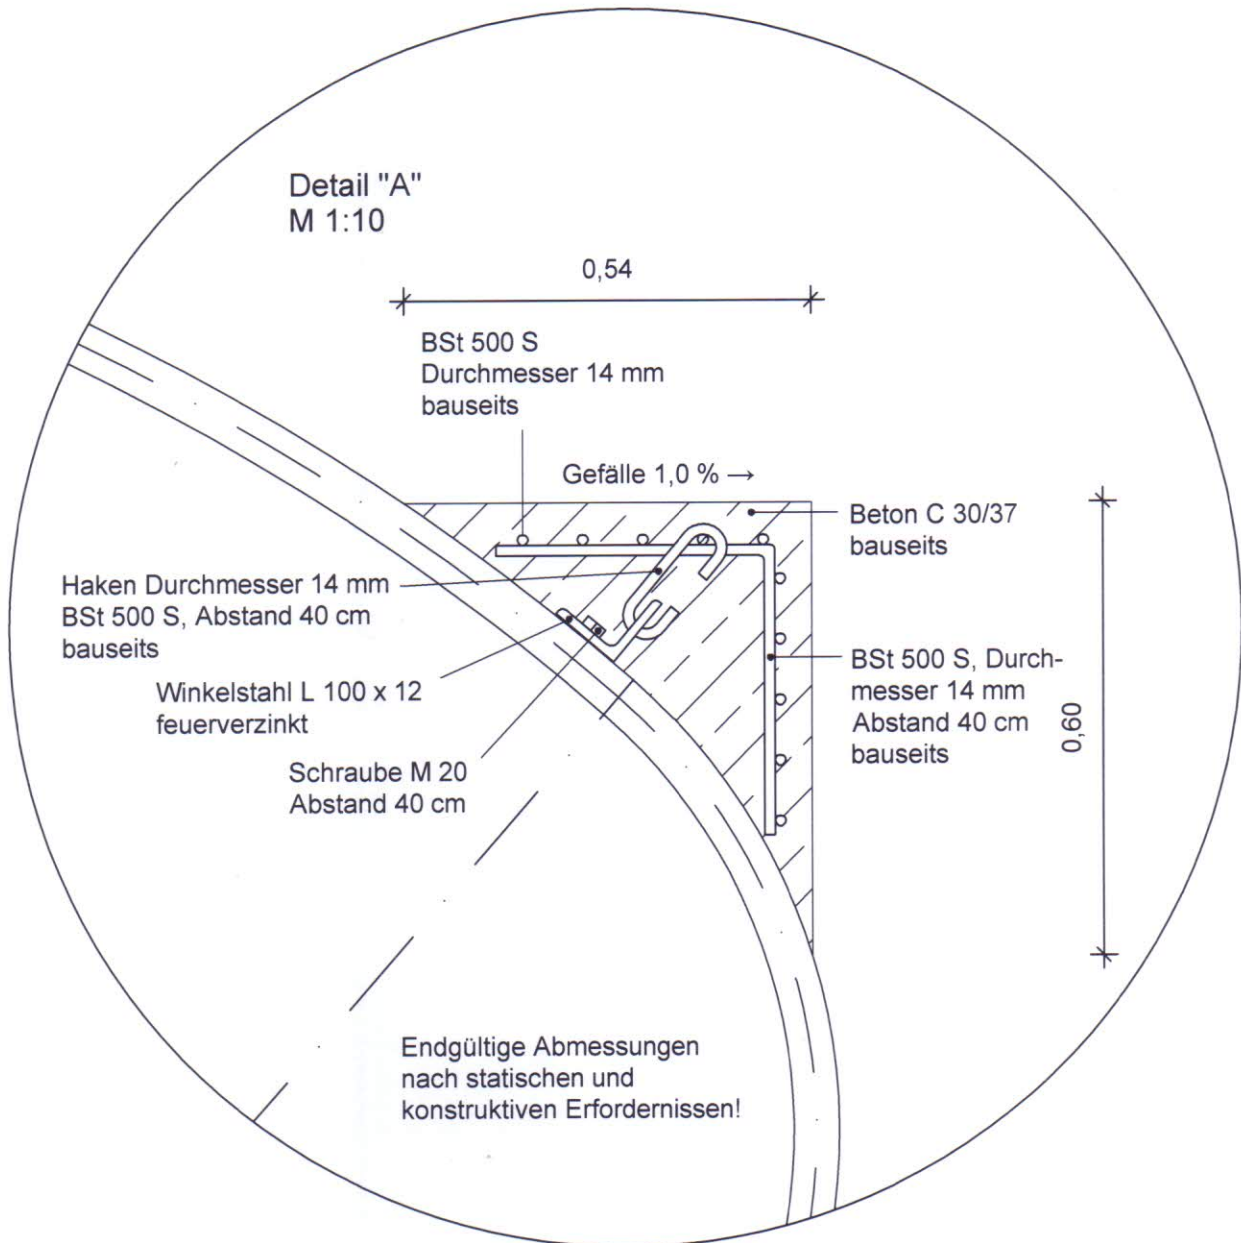


Erwin Peetz GmbH & Co. KG, Büro Augsburg
Dasinger Straße 2, 86165 Augsburg
Tel. 0821/70 20 20, Fax 70 19 58

Bauteil:	Querschnitt	Einheit [m]
VARIO-SEC Multi-Plate 200x55	Maßstab	1:10
Korbbogen-Profil SB 10	Datum	07.08.2017
Spannweite: 4,77 / 4,74 m	Gezeichnet	Unger Dipl.-Ing. (FH)
Höhe: 1,57 m	Änderung	
Fläche: 5,66 m ²		
Umfang: 6,22 m		

VARIO-SEC® Stahlfertigteile

VARIO-SEC Korbbogen-Profil SB 10

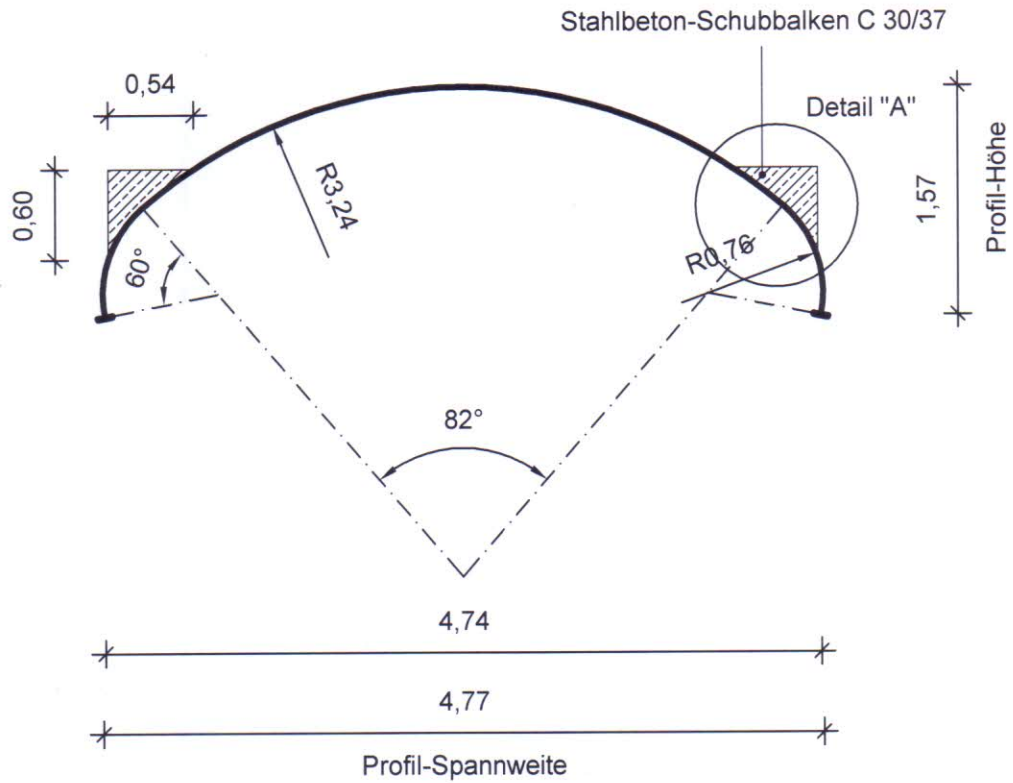

Erwin Peetz GmbH & Co. KG, Büro Augsburg
 Dasinger Straße 2, 86165 Augsburg
 Tel. 0821/70 20 20, Fax 70 19 58

Bauteil:	Querschnitt	Einheit [m]
VARIO-SEC Multi-Plate 200x55	Maßstab	1:50
Korbbogen-Profil SB 10	Datum	07.08.2017
Spannweite: 4,77 / 4,74 m	Gezeichnet	Unger Dipl.-Ing. (FH)
Höhe: 1,57 m	Änderung	
Fläche: 5,66 m ²		
Umfang: 6,22 m		
